Projet 16 Quartiers 6 Camps (16/6)

Passerelle métallique reliant Morne Hercule au quartier de Nerette

Espace récréatif dans la zone pilote de Morne Hercule

Dalot en contruction à Delmas 64

Travailleurs sur le site de Delmas 64

La Réhabilitation des quartiers du 16/6, une approche intégrée !

1. PROCESSUS DE RETOUR

➲ **Qu'est-il arrivé et pourquoi?**

Les activités relatives à la composante Retour du Projet ont été finalisées à date. Des activités additionnelles liées à la création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de l'information ont été entreprises et complétées au début de l'année 2013.

Composante Retour en chiffres

1. Réalisation des 2 projets combinés

16/6 & Champs de Mars

- **50 Camps fermés**
- **11032 familles enregistrées**
- **11008 familles relocalisées**

2. Relocalisation VS Période

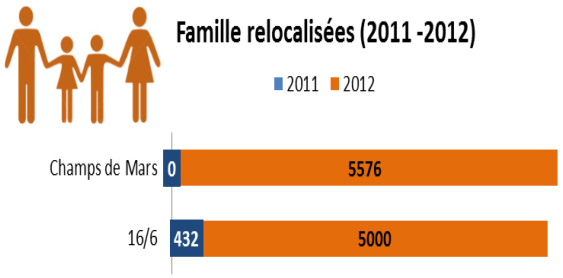

2. LOGEMENT

Réparation de Maisons endommagées

Réparation de Maisons endommagées (Jaunes & Rouges) avec UNOPS

Les activités du volet réparation des maisons endommagées du projet de logement ont été clôturées au cours du mois de février 2013.

Les habitants des quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Morne Hebo, Jean-Baptiste et Bois-Patate ont pu bénéficier des travaux de réparation et de renforcement de leurs maisons endommagées.

Au total, 1,209 familles sur 1,150 ont pu bénéficier du renforcement des maisons endommagées. Ce qui équivaut à 735 maisons réparées.

Réparation de Maisons endommagées avec Carmen à Villa Rosa

La méthodologie de réparation de Carmen : owner-driven est utilisée pour réparer les maisons endommagées de Villa Rosa. Jusqu'à ce jour, un total de **297 maisons ont été évaluées et 204 maisons ont été réparées**.

➲ **Les difficultés rencontrées**

Malgré la fin du programme, certaines maisons touchées par la réparation de CARMEN restent encore à être finalisées. Certaines personnes ont utilisé les tranches d'argent à d'autres fins, mais promettent de continuer elles-mêmes au fur et à mesure. D'autres ont décidé au cours de route, d'augmenter les travaux à faire dans leurs maisons ce qui rend les fonds disposés par CARMEN insuffisants pour achever la réparation. Des options de solutions sont à l'étude afin de finaliser ces maisons avant la fin de l'année.

➲ **Les leçons apprises**

Les leçons apprises de la première phase de réparation a permis à l'équipe de CARMEN de faire des ajustements quant à la méthodologie. Ces ajustements ont aussi et surtout permis d'améliorer le rendement, la qualité de la réparation, le rapport avec les bénéficiaires, la gestion des ingénieurs et des

maçons, la finition et la peinture des maisons et de réduire considérablement la durée de réparation des maisons. Par exemple la décision d'effectuer les transferts de fonds via le système E-voucher, c'est-à-dire, les bénéficiaires ne pourront plus recevoir du cash via Tchotcho mobile, mais seront obligés d'acheter de la peinture dans une quincaillerie inscrite dans le programme. Cette mesure a été prise pour contraindre les bénéficiaires à achever leurs maisons jusqu'à la peinture pour rester dans l'objectif du projet 16/6. En effet, le 1er groupe de 98 maisons avait été réparé en plus de 7 mois, alors que le 2e groupe de 106 maisons l'a été seulement en 1 mois et 1 semaine.

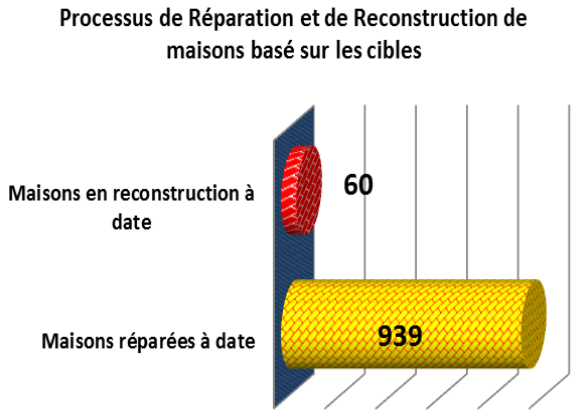
Processus de Réparation et de Reconstruction de maisons basé sur les cibles
Maisons en reconstruction à date
60
Maisons réparées à date
939

Réparation de Maisons endommagées à Fort-National dans le cadre de la Réhabilitation de Champs de Mars

La méthode Agency-driven ayant donné des résultats satisfaisants jusqu'à présent a été maintenue pour les interventions futures dans le quartier de Fort-National dans le cadre du Projet de Réhabilitation de la zone de Champs de Mars.

Par ailleurs, le projet de réparation de maisons endommagées du Champ-de-Mars a débuté en janvier 2013, par l'identification des quartiers d'intervention. Ce projet, qui est une réplique du projet 16/6, est financé par l'ACDI.

Les évaluations ont déjà commencé dans le quartier de Fort-National.

Reconstruction de maisons rouges/détruites

➲ **Qu'est-il arrivé et pourquoi?**

Phase pilote de construction de 60 maisons dans les quartiers de Nérette, de Morne Hercule et Morne Lazare;

✓ **Morne Hercule**

- **Remise des clés**

17 maisons de 33 unités finalisées à Morne Hercule. Les responsables du projet 16/6 ont décidé de permettre aux 17 familles bénéficiaires de prendre possession de leurs maisons nouvellement construites. Ces familles, vivaient pour la plupart dans des conditions difficiles depuis le début des travaux de construction. Dans le but de permettre une bonne utilisation des maisons et de l'espace commun, un manuel d'entretien a été élaboré par les techniciens du projet (ingénieurs et architectes).

✓ **Nérette**

Parallèlement, l'équipe achevait la construction de 14 maisons dans la zone de Nérette.

Les firmes de constructions mettaient les bouchées doubles afin de permettre aux bénéficiaires de ce quartier de jouir de leur maison le plus rapidement que possible.

À noter que les responsables du projet ont dû mettre fin au projet pilote d'auto construction d'une maison initiée quelques mois plus tôt à Nérette, en raison du fait que le bénéficiaire refusait de se plier aux recommandations des ingénieurs du projet.

A date, 14 maisons sont en phase finale d'achèvement à Nérette.

Module de base construit à Nérette (ct photo : UNOPS Logement)

SEIZE QUARTIERS / SIX CAMPS

✓ **Morne Lazare**

Dans le quartier de Morne Lazare, les travaux continuent pour la construction de 29 maisons sur le site collectif. La sélection des bénéficiaires est également en cours de finalisation.

À la fin de la période, 2 firmes sous-traitées achevaient les travaux de construction de dalles d'une dizaine de chantiers.

➲ **Leçons apprises et recommandations**

La construction des 17 maisons du site collectif de Morne Hercule est pratiquement arrivée à sa fin.

Le site comprend différends blocs : tous ces blocs ont été formés à partir d'un module de base donnant la possibilité de faire des expansions verticales ; alors que la structure de certaines autres maisons offrait la possibilité de faire des expansions latérales.

Le module de base a été adopté par le projet à la suite de différentes rencontres effectuées avec les membres de la communauté. La conception de la maison tient compte des habitudes sociales des habitants de la zone.

Le projet pilote a permis non seulement de montrer différentes pistes de solutions dans la reconstruction de maisons mais il a également tenté d'apporter des éléments de réponse dans la problématique du logement en Haïti.

Solution aux problèmes fonciers

De plus, le projet 16/6 a adressé de façon scientifique les questions relatives aux problèmes fonciers. La section juridique a élaboré plusieurs solutions afin de permettre aux bénéficiaires de jouir pleinement de leurs maisons nouvellement construites. Les solutions sont les suivantes:

1. Élaboration d'un contrat de construction entre le projet et les bénéficiaires du programme ;
2. Rédaction d'un procès-verbal par un juge de paix attestant que le bénéficiaire réside dans la zone depuis x années ;
3. Constitution d'un comité de gestion de logement en vue de résoudre les conflits.

Création d'emploi

Le projet a également généré des emplois dans les quartiers où il a été implanté. À Morne Hercule comme dans les autres quartiers d'intervention, la majorité des ouvriers de chantiers ont été recrutés dans la zone. Ces ouvriers ont bénéficié de formation dispensée par le Bureau International du Travail augmentant ainsi la banque de connaissances techniques dans le domaine de la maçonnerie antisismique.

Maisons plus sécuritaires

Les maisons ont été construites selon la méthode de maçonnerie chainée.

La firme de construction Américaine Degenkholb a été engagée afin de réaliser les études structurelles qui ont permis la construction des logements.

Des études géotechniques ont également été menées par des ingénieurs qualifiés afin d'évaluer la capacité portante du sol. Suite à ces dernières, des recommandations sur l'érection de murs de soutènements ont été faites.

Assainissement du site de logement collectif

Le site pilote est doté d'un système d'évacuation de déchets contenant des toilettes et des fosses septiques.

Le système est également composé d'un puisard ou filtre d'épuration ayant la capacité de faire décanter les matières solides et les hydrolyser par fermentation.

<u>Formation en construction parasismique et maçonnerie chainée</u>

Résultats à date

- 63 formateurs d'ouvriers (sur les 60 prévus) ont été formés, certifiés en obtenant graduellement une Attestation d'Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de l'INFP.

- **Sélection et formation des ouvriers semi qualifiés**

Le programme de formation des ouvriers en construction parasismique a débuté le 17 septembre 2012, dans le quartier de Morne Hercule, suivant le calendrier établi par l'équipe de réparation. Vu l'étroitesse du site de construction et le nombre limité des premières maisons, 28 contremaitres et ouvriers sont formés et certifiés pour la phase pilote, directement sur le site de Morne Hercule, sur les

constructions des 4 premiers blocs de maisons, (qui représentent 17 logements).

✓ **Placement des personnes formées après Attestation**

Après avoir obtenu leur AAP, les ouvriers attestés seront engagés pour reconstruire d'autres maisons dans les quartiers du «projet 16/6». Sous la supervision de formateurs, ils pourront acquérir, après 900 heures de travail sur le site, une Certification d'ouvrier qualifié (CAP) dispensée par l'INFP. Ces ouvriers devront se référer à l'UNOPS et aux autres contractants. L'activité des formateurs et des ouvriers formés sur les chantiers du 16/6 se limite actuellement à la reconstruction de « maisons rouges ». Toutefois, à échéance plus lointaine, les formateurs et les «boss» (artisans /ouvriers) seront sollicités pour la réhabilitation des «maisons jaunes ». Une initiation en ce sens et une visite de chantier ont été incluses pour cela dans le programme de formation des formateurs.

✓ **Renforcement des capacités de gestion des petites entreprises de la construction**

- 16 formateurs certifiés au module de formation « Améliorer Son Entreprise de la Construction (ASECO) »
- 7 entrepreneurs formés au module de formation « Améliorer Son Entreprise de la Construction (ASECO) »
- La capacité de 15 entreprises a été directement renforcée et soutenue

3. REHABILITATION DES QUARTIERS

Plateformes communautaires

Aujourd'hui, après leur création, leur validation par la communauté, les autorités locales et gouvernementales, les huit (8) plateformes communautaires ont la possibilité de fonctionner comme une véritable institution et personne morale après avoir obtenu leur certificat de reconnaissance légale, non seulement auprès des mairies concernées (Port-au-Prince et Pétion-Ville, mais également du Ministère des Affaires Sociales et du Travail).

✓ **Renforcement des Capacités des Plateformes Communautaires**

La firme QMG a été finalement sélectionnée pour dispenser la formation continue aux Plateformes communautaires. Cette 2e phase de formation doit démarrer à la mi-septembre. Les inscriptions sont en cours ainsi que le processus administratif.

✓ **Petits projets**

A date, sur 17 petits projets présentés à la commission d'évaluation des Petits projets, 12 ont été validés. Les premiers virements bancaires ont été effectués sur le compte des Plateformes communautaires sous le couvert de la signature d'un Micro capital Grant entre le PNUD et les Plateformes communautaires.

Une séance de formation en gestion de chantiers et le suivi administratif a été tenue les 27, 28 Aout 2013 à laquelle les membres de Plateformes ont participé activement.

La planification avec l'équipe technique composée des ingénieurs du projet, des mobilisateurs et une assistante technique et les Plateformes communautaires sont en cours. Les Plateformes communautaires devraient aller vérifier la balance de leur compte bancaire, prendre les proforma, préparer les chèques, faire la requête de signature du Directeur de Projet, faire les premières acquisitions de matériaux selon la liste préparée par les ingénieurs et embaucher les manœuvres

L'exécution des petits projets doit être lancée la 2e semaine de Septembre 2013.

✓ **Centres communautaires**

▪ **Canapé-vert**

Les démarches continuent dans les différents quartiers de Canapé-Vert et auprès des mairies afin de faire l'acquisition soit d'un terrain privé, ou un terrain public sur lequel le centre communautaire peut être construit.

▪ **Pétion-Ville**

Les travaux ont débuté dans trois quartiers : Nérette, Jalousie et Morne Hercule, depuis la fin du mois d'Août avec la firme Entrepreneurs du Monde. Des visites d'étude géophysique ont été effectuées avec Entrepreneurs du Monde en consultation avec les plateformes communautaires afin d'évaluer l'appropriation des terrains par rapport au type de construction souhaité.

Les plans ont été finalisés sauf pour Nérette dont le site présente des particularités et des risques qui doivent être pris en compte et nécessitant des travaux de renforcement. La démolition, le nivellement du site ont déjà pris fin. L'approvisionnement des matériaux a débuté.

- **Morne Lazare**

Les discussions sont en cours avec le propriétaire d'un terrain identifié capable d'héberger le centre communautaire.

Planification communautaire

16/6

Dans le cadre du Projet 16/6, la planification communautaire dans les 8 quartiers ciblés a été finalisée et a permis l'élaboration des scenarios d'investissement.

Champs de Mars

Un exercice consultatif en 3 phases similaire à celui du projet 16/6 a été initié dans le quartier de Fort National, quartier de retour sélectionné dans le cadre du Projet de Réhabilitation de la zone de Champs de Mars :

✓ **Etablissement d'une structure de travail avec la communauté pour la réalisation du diagnostic urbain**

Dans le cadre du Projet de Réhabilitation de Champs de Mars, la phase préliminaire de création de la cellule communautaire de Fort-National est finalisée avec 9 membres élus. Sur la demande du coordinateur du projet, la représentativité doit être améliorée. Les ateliers de consultation avec la communauté seront organisés sur cette base en faisant intervenir un plus grand nombre d'acteurs impliqués dans le quartier.

✓ **Plateforme de coordination avec la Mairie et le MTPTC pour la validation technique du diagnostic**

Une unité de coordination a été établie avec la Mairie de Port-au-Prince ainsi qu'avec les services de la Direction des Travaux Publics (SPU, SGU).

✓ **Réalisation du diagnostic urbain**

L'identification du bâti et des infrastructures a débuté mi-juin tout comme la création d'un SIG.

Plan de Prévention de Risques

La cartographie des risques a été réalisée dans les quartiers du 16/6. Les résultats ont été pris en compte dans la sélection des maisons pour la réparation et la reconstruction ainsi que pour la réalisation des projets d'infrastructures dans le cadre des investissements publics.

Un amendement a été signé avec IMSRN pour la réalisation de la cartographie de Jalousie, quartier de retour du 16/6 non prévu, la zone élargie de Canapé-vert selon la nouvelle délimitation faite lors des exercices de planifications et le quartier de Fort National dans le cadre du Projet de Réhabilitation de la zone de Champs de Mars.

Le rapport final de l'analyse microzonale de Fort-National a été finalisé, une présentation a été faite à l'équipe intervenant sur Fort-National dans le cadre du Projet.

L'analyse pour la zone élargie de Canapé-Vert ainsi que de Jalousie en cours et sera finalisé au cours des mois à venir.

Investissements publics dans les quartiers

➲ **Qu'est-il arrivé et pourquoi?**

✓ **Construction de routes, sentiers, de drainage et réalisation de travaux de mitigation**

- Créations d'emplois : 2,682
- Construction de route : 3,266 ML dans trois quartiers : Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ;
- Construction de sentiers : 901.4 ML à Morne Hercule, Morne Lazare et Canapé-Vert (Villa-Rosa)
- Construction de trottoirs : 2,731 ML
- La construction du dalot de Delmas 64 reliant la route Charlemagne Péralte à l'autoroute de Delmas est en cours de réalisation. Les équipes du projet 16/6 travaillent d'arrache-pied en vue de terminer avec les travaux dans la 2ème semaine du mois de Septembre 2013.

✓ **Aménagement sur le site pilote de Morne Hercule et de la rue de la Paix**

- Fin des travaux d'aménagement sur le site pilote de Morne Hercule ;
- Fin de la construction de la rue de La Paix.

✓ **Lampadaires solaires installés à Jean-Baptiste et à Canapé- Vert**

- **Eclairage et électricité**

Les activités d'installation de lampadaires ont été achevées à plus de 100 %. 243 lampadaires solaires additionnels sont été installés par le projet 16/6 portant le nombre total d'installation de lampadaires à 492 dans 7 quartiers du projet (Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Bois Patate, Canapé Vert, Morne Hebo et Villa Rosa).

Les habitants des quartiers bénéficiant des lampadaires solaires témoignent de l'amélioration de l'éclairage et de la sécurité dans leur communauté.

La mise en place des transformateurs continue, l'équipe a déjà terminé avec l'installation des pylônes dans le quartier de Bois-Patate.

Présentement, la firme exécute les travaux de câblage dans les quartiers de Nérette et de Bois-Patate.

✓ **Assainissement**

Les travaux de curage et de drainage des ravines se poursuivent dans les quartiers d'Hébo et de Bois-Patate.

Les 90% des travaux de drainages ont été achevés dans la zone de Villa-Rosa.

✓ **Réseau d'eau Potable**

Les travaux de construction et de réhabilitation des fontaines d'eau dans les quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette sont terminés. Les habitants du quartier de Morne Lazare ont déjà commencé à jouir des services fournis par ces kiosques d'eau. Alors que pour les autres quartiers, l'interconnexion avec la DINEPA a été retardée en raison des procédures administratives entre les responsables du projet et de l'instance gouvernementale (DINEPA).

✓ **Comités de gestion dans les communautés**

La mise sur pied des comités de gestion dans les communautés représente une activité importante dans la réalisation des objectifs du projet 16/6.

Tous les comités de gestion ont été mis sur pied par le projet.

Afin de structurer et de renforcer les capacités de ces comités, le projet 16/6 a élaboré un programme de formation sur la gestion des conflits, les techniques de rédaction de rapport, l'élaboration et gestion de projet, la gestion des finances personnelles etc.

✓ **Construction d'espace récréatif**

La construction des espaces récréatifs dans les quartiers de Nérette et de Morne Lazare a été complètement achevée. Les habitants de ces quartiers et plus précisément les jeunes ont commencé à jouir de ces espaces. Avec les vacances de l'été, des championnats de football et de basketball sont en train d'être organisés pour le plus grand bonheur de la population. Alors que la construction de l'espace récréatif de Trou Rosemont à Villa Rosa entame sa phase terminale. La fin des travaux est prévue pour la 2ème semaine du mois de Septembre.

✓ **Identification de couloirs et numérotation des maisons à Morne Hebo**

Suite à une demande de la plateforme communautaire de la zone, le projet 16/6 a initié, un projet d'identification de couloirs et de numérotation des maisons.

Numérotation de maisons à Mont Hébo

À la fin de ce projet, des numéros ont été attribués à 432 bâtiments; alors que 26 voies de circulation ont été identifiées par des panneaux indicateurs.

Panneaux identifiant les couloirs à Mont Hébo

➲ **Leçons apprises et recommandations**

La construction et l'aménagement d'espaces publics ont été le choix des communautés dans plusieurs quartiers du projet. Les jeunes de ces quartiers n'ont pas hésité à choisir les options de construction d'espaces récréatifs comme des interventions prioritaires du projet.

En Haïti, il y un manque de loisir et d'espace de détente. Les jeunes sont souvent livrés à eux-mêmes et c'est encore pire pendant les périodes estivales. Généralement pendant cette période les enfants restent chez eux à ne rien faire. La construction de ces espaces va permettre aux jeunes des quartiers de se retrouver dans des endroits sains, ils donneront aussi à ces derniers la possibilité de pratiquer des activités sportives qui seront bénéfiques à leur santé physique et mentale.

Le succès de la construction des espaces publics n'aurait pas été possible sans la collaboration des agences partenaires telles que: « Architecte de l'Urgence », « Architect for Humanity » et « GOAL ».

CHAMPS DE MARS

Les activités du projet du Champs de Mars ont débuté au cours du mois d'Avril 2013 et la zone d'intervention retenue a été celle du Fort National.

Tout comme le projet 16/6, d'autres agences des Nations Unies y feront partie.

Pour le présent moment, l'équipe de logement est en train de faire les activités d'évaluations dans le quartier du Fort National et les agents mobilisateurs communautaires sont entrain de recueillir des informations sur les familles et leurs parcelles afin d'établir des objectifs sur la quantité de bénéficiaires ciblés et de logements à reconstruire.

En raison des particularités du sol, des études géotechniques ont été entreprises par l'équipe. Et les premières informations provenant de ces études montrent la nécessité pour le projet de prioriser une construction en gradin. Des murs de soutènements seront également nécessaires dans la construction de logement au Fort National.

➲ **Comment cela a-t-il contribué à l'autonomisation, l'épanouissement et la sécurité des femmes**

Les femmes des quartiers du 16/6 participent activement dans les toutes activités réalisées dans leurs communauté depuis la planification jusqu'à l'exécution. Elles ne sentent ni exclues, ni mises à l'écart. Leur voix est écoutée et leurs priorités sont prises en compte. Pour elles, le projet 16/6 est leur « bébé », leur affaire.

Activités Génératrices de Revenus

➲ **Qu'est-il arrivé et pourquoi?**

Dans le cadre des activités Génératrices de revenus, parmi les initiatives lancées, il y a PDF et Ann Ale qui sont en cours et progressent au fur et à mesure dans le but de dynamiser et renforcer les secteurs économique et commercial au niveau des quartiers du 16/6 et dans le pays d'une manière générale.

SIXTEEN QUARTIERS / SIX CAMPS

HAÏTI
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES FOURNISSEURS
CRÉATIONS DES MARCHÉS INCLUSIFS

Réalisations

Concernant le Programme de Développement des Fournisseurs, la promotion auprès des entreprises leaders et fournisseurs continuent afin de leur proposer un travail de renforcement avec une méthodologie efficace pour un meilleur rendement sur le marché haïtien. Entre temps, deux chaines de valeurs ont déjà été mises en branle. Il s'agit bien de l'UNOPS comme entreprise leader et les firmes de constructions qui exécutent ses travaux de chantiers. Egalement, il y a la compagnie pétrolière « Total » et trois entreprises fournisseuses à son compte. D'autres chaines sont en train de formalisation, notamment la DINEPA et les comités d'eau dans les quartiers qui peuvent bénéficier d'une sorte de renforcement avec la méthodologie PDF.

Pour plus d'informations sur le PDF, vous pouvez consulter le site du programme : http://www.pdf.com.ht. Là-dessus, vous y trouvez la vidéo de présentation de la méthodologie du PDF.

16/6 ANN ALE

Le Projet Ann Ale avance à grand pas selon la planification. Suite à l'enquête réalisée pour recenser les commerces se trouvant dans les quartiers du 16/6. Plus de 1628 commerces ont été recensés. Cependant, n'ayant pas la capacité d'appuyer tous les commerces recensés, un total de 950 bénéficiaires a été choisi pour être appuyé par le projet 16/6 à divers niveaux, notamment avec des formations sur plusieurs thématiques liés au commerce, des produits de renforcement de la visibilité et d'amélioration de la qualité des services fournis.

Une enquête supplémentaire a été lancée au milieu du mois d'août pour identifier d'autres potentiels bénéficiaires capables de bénéficier des activités de renforcement (formation et produits de visibilité) au profit des petits commerces. En ce sens, 120 nouvelles personnes doivent être enquêtées sur Canapé-Vert et Pétion-Ville pour compléter les 1628 personnes déjà enquêtées.

Réalisations

- **Formation**

Les séances de formation continuent pour les potentiels bénéficiaires du programme Ann Ale déjà repérés. Le premier groupe a terminé avec les différents modules et a reçu leur certificat de participation. Entre temps, étant donné que les camions mobiles organisés en salle de classe ne sont pas encore prêts, l'ancien local de CARMEN à Canapé-Vert a été loué pour les mois d'août et de septembre pour permettre à plus de personnes d'avoir accès à la formation. Ainsi, les séances de formation sont réparties pour l'instant sur trois quartiers avec 2 groupes dans le local de COGEC à Jalousie, 1 groupe au local de l'Ecole Léa Kokoye 1 à Nérette et 5 groupes à l'ancien local de CARMEN.

- **Ligne graphique**

Au niveau des lignes graphiques, elles se font au fur et à mesure que la formation se réalise. Pour les enseignes, The Edge est en train d'en finaliser pour 22 bénéficiaires qui lui ont été soumis. Lesquelles enseignes seront faites en imprimant les desseins sur du vinyle et faire une application sur de la tôle galvanisée non oxydable de 3 pieds x 2 pieds.

4. SUIVI ET EVALUATION ET GESTION DE CONNAISSANCES

➲ **Renforcement de l'équipe de Suivi et Evaluation et Gestion de Connaissances**

✓ Le recrutement d'un éditeur pour les produits de connaissances est en cours.

✓ Un consultant en ligne graphique a été recruté avec l'aide de l'équipe de Panama. Plusieurs propositions de ligne graphique sur le document des plateformes communautaires ont été

présentées pour commentaires.

➲ **Systématisation des Leçons apprises et bonnes pratiques**

Le premier document de gestion de connaissances ainsi que la brochure sur les plateformes communautaires ont été soumis au consultant en ligne graphique pour l'exercice de mise en page. Un premier draft du document a déjà été soumis pour commentaires.

Entre temps, l'équipe de gestion de connaissances avance avec la production sur les différentes thématiques. La modalité de travail des consultants a été modifiée afin d'améliorer la production donc le rendement de chaque consultant. Maintenant, chaque consultant travaille sur une thématique à part entière afin d'aboutir à plusieurs documents élaborés simultanément à soumettre pour commentaires auprès du staff du projet. Ainsi, les prochains documents élaborés seront basés sur les thématiques *« Activités génératrices de revenus », « Réparation et reconstruction des maisons », « réhabilitation des quartiers » et « Planification communautaire »*.

➲ **Data Warehouse (Base de données globale)**

Le Data Warehouse est aujourd'hui opérationnel et accessible à tout le monde. Le lien pour y accéder est: http://ruandunduma120.org/uclbp/main.jsp?target=home.

Plusieurs rapports venant des différentes Agences d'exécution et des Agences partenaires ont été mis en ligne dans le Data Warehouse. Une alimentation continue sera faite afin de le tenir constamment à jour. Une séance d'orientation sur l'utilisation du Data Warehouse a eu lieu avec l'équipe du 16/6. D'autres séances sont prévues avec les autres Agences pour une meilleure gestion et alimentation de cette base de données globale sur les activités liées à la reconstruction en Haïti.

➲ **Visites de suivis**

Des visites périodiques sont prévues et sont effectuées chaque semaine par l'équipe des ingénieurs dans les quartiers afin de suivre le déroulement des activités sur le terrain.

➲ **Enquête de satisfaction**

✓ **Maisons réparées finalisée.**
Le rapport a été soumis. Une restitution des principaux résultats a été faite le 20 mai 2013.

✓ **Plateformes communautaires finalisée à la fin du mois de mai.**
Environ 1248 personnes ont répondu aux questions des enquêteurs. Le premier draft du rapport de l'enquête sur les plateformes communautaires a été soumis au staff pour les premiers commentaires. Maintenant, il est en phase de finalisation pour soumission définitive. La prochaine enquête à réaliser sera les « Activités génératrices de Revenus et les investissements dans les quartiers.

✓ **Checklist de satisfaction sur les maisons réparées et reconstruites**

Ce checklist de satisfaction est un outil complémentaire de l'enquête de satisfaction déjà réalisée sur les maisons réparées. Il permettra de vérifier le respect de tous les principes préalablement définis dans le cadre de la réparation et la reconstruction des maisons dans le cadre du projet 16/6. Il profitera aussi de vérifier à quel niveau que les informations ont été communiquées sur les principes de construction aux bénéficiaires.

✓ **Processus de retour à réaliser à la mi-octobre.**

- Termes de références et méthodologie en cours d'élaboration
- Elaboration des outils d'enquête en cours

➲ **Comité de pilotage**
Le 2e Comité de Pilotage a été réalisé au cours du mois de Mars comme prévu. Depuis, il a été décidé de tenir le comité de pilotage plus régulièrement. Par conséquent, une nouvelle session doit être réalisé à la fin du mois de Septembre 2013.

- **Réalisations de Vidéos et documentaires du projet**
  Deux firmes ont été embauchées pour la réalisation de vidéos et documentaires informatifs du projet dans le cadre de la systématisation de l'expérience du projet : Ciné Institute réalise des vidéos et documentaires sur l'ensemble des composantes et activités du projet et Kanaki qui réalise des Histoires de vie illustrant la vie dans les quartiers du 16/6. Des vidéos et documentaires ont déjà été finalisés. Des séances de screening sont en cours afin dans les quartiers afin de les diffuser aux membres de Plateformes communautaires et leurs communautés respectives.

- **Evaluation et Formation des Plateformes communautaires**

  Après un an de la mise en place des plateformes communautaires, une journée de réflexion et d'évaluation est prévue pour le mois de septembre avec les divers acteurs qui ont travaillé de près ou à un niveau quelconque avec ces dernières. Cette journée se tournera autour du mode de fonctionnement des plateformes, leur performance par rapport aux termes de référence qui guident leurs actions, de leur utilité dans leur communauté.

  En ce qui a trait à la formation des plateformes, une firme de formation a été recrutée pour les former. La signature du contrat avec cette dernière est en cours. Les séances de formations doivent débuter sous peu.

- **After Action Review**
  Compte tenu de l'atelier de systématisation finale du projet doit être réalisé au cours du mois d'octobre ou de novembre, l'After Action Review qui a été projeté pour le mois de septembre a été annulé. L'atelier final se fera autour des mêmes objectifs de l'After Action Review et avec les mêmes acteurs prévus.

- **Dashboard**- Draft du 6e Dashboard envoyé et partagé pour commentaires

- **Rapport Trimestriel**- Rapport trimestriel en cours de rédaction

5. COMMUNICATION

Au niveau de la communication, les activités marchent à grand pas pour faciliter la compréhension et l'acceptation des interventions du projet 16/6 au niveau des quartiers. Afin d'avoir des archives imagées, la couverture en photo et en vidéo des principales interventions du projet dans les différents quartiers continuent.

✓ **Les Produits de visibilité**

La conception et l'installation des produits de visibilité vont bon train. Les plaques métalliques sur les lampadaires et les Kiosques d'eau sont déjà réalisées et en attente d'installation. La situation n'est pas différente pour les plaques métalliques à placer sur les espaces récréatifs. Cependant, les grands panneaux de visibilité faisant référence aux scénarios d'investissement réalisé dans les quartiers et aux plans de prévention de risques sont en cours d'installation. 8 sont déjà installées, soit 2 dans le quartier de Morne Lazare, 2 à Nérette, 2 à Morne Hébo et 2 à Bois-Patate. Pour Fort-National, 3 roll up, 5 banderoles et 5000 flyers ont été conçus et produits pour lancer la sensibilisation de la population de ce quartier sur les prochaines interventions du projet 16/6.

✓ **Web site du projet**

Web site du projet 16/6 maintenant opérationnel (www.projet16-6.org)

Afin de continuer à alimenter le Website du projet 16/6 qui est aujourd'hui un bon canal d'information pour s'informer sur les différentes activités, une matrice d'articles d'information est en cours de création. Entre temps, des articles sont rédigés sur les activités à Morne Hebo, Villa Rosa et sur la remise de certificats au premier groupe de personnes formées par Ann Ale. D'autres articles sont en préparation, notamment sur le tournoi de football entre les quartiers de 16/6, la formation en photographie et vidéographie réalisée pour les enfants des quartiers 16/6 et sur le championnat de football à Nérette sur le terrain réhabilité dans le cadre du projet 16/6.

Beaucoup d'autres activités sont réalisées ou en cours de réalisation en termes de mesures communicationnelles. Entres autres :

✓ **Screening**

4 séances de screening tenus dans certains quartiers 16/6, notamment à Morne Hercule et Villa Rosa.

✓ **Formation en photographie et en vidéographie**

La formation en photographie et en vidéographie pour les enfants des quartiers de Canapé-Vert. Pour les enfants des quartiers de Pétion-Ville, la formation est prévue pour bientôt.

✓ **Organisation d'un tournoi de football**

Organisation d'un tournoi de football avec des équipes venant des 8 quartiers du 16/6 qui s'est tenu du 25 au 31 août 2013 à Juvénat au parc Brémont. Ce championnat s'est terminé avec la victoire de l'équipe de Jalousie sur celle de Morne Hébo 2 buts à 0. Ce championnat a pris fin avec un concert réalisé avec les artistes haïtiens Jean Jean Roosevelt et BIC.

✓ **Les mercredis de la communication**

Les mercredis de la communication qui a été institué depuis plusieurs semaines. Cette activité consiste à visiter deux des quartiers chaque mercredi en prenant des photos des réalisations, en rédigeant un article d'informations et un reportage sur l'état des interventions dans ces dits quartiers.

✓ **Le projet en photos**

Le projet 16/6 en photo, le projet en chiffre et les grandes dates du projet en cours de préparation.

✓ **Reportages et autres**

Un appui a été donné à l'équipe de France O et Martinique première dans la réalisation d'un documentaire de 52 minutes sur la reconstruction trois ans après le séisme.

16/6 SEIZE QUARTIERS / SIX CAMPS

HISTOIRE DE LA PERIODE

Nos bénéficiaires nous parlent !

La 5ème Edition du Championnat de football de Nérette dédiée au 16/6

A peine un mois que ce terrain est disponible pour la pratique du sport le plus populaire d'Haïti que déjà des dizaines de jeunes se donnent rendez-vous à toute heure du jour pour jouer mais aussi pour s'entraîner en prévision du championnat de football . Chaque année, depuis 2008, à pareille époque, la population de Nérette fait de cet espace son lieu de prédilection. N'ayant pas d'autres loisirs, elle y venait tous les après-midis, du moins quand Dame Nature le permettait, pour assister aux matches de football qui opposaient les équipes représentant les différents blocs du quartier.

Cette année, l'engouement était plus que total. Tout le quartier attendait avec impatience la date du 11 août 2013, jour du début du Championnat. On avait hâte de voir évoluer les jeunes sur ce terrain réhabilité par le projet 16/6 qui devient un espace récréatif avec terrain multi sports n'ayant rien à envier aux espaces d'ailleurs. « Je suis aux anges ! Ce championnat sur ce terrain confirme que mon quartier renaît. Le Comité a été renforcé, les équipes sont plus nombreuses à participer. Même les règlements régissant le championnat ont été modifiés. J'ai la certitude que le Succès sera retentissant », nous confie Chérubin Olivier, un passionné du ballon rond.

Pour Rodrigue Joseph, un jeune latéral au pied gauche magique qui a dû demander l'aval de ses coéquipiers pour nous parler, cette cinquième Edition sera marquée du sceau du projet 16/6. « Je m'entraîne 3 fois par jour ici avec mes amis, même les soirs grâce aux lampadaires. Je cherche à maîtriser ma conduite de balle sur cette nouvelle surface et j'améliore mes centres offrant du même coup à mes partenaires l'occasion d'améliorer leur jeu de tête ». Finalistes, l'an dernier, lors d'une finale qui s'est jouée sur un terrain boueux, Rodrigue espère l'emporter cette année et du même coup dédier le but de la victoire à toute l'équipe du 16/6.

Même au sein du Comité, le langage ne diffère pas. L'un des organisateurs du Championnat, Jeudy croit que tout est pour le mieux pour cette Edition, tout en rendant un hommage au projet : « ce sera un Succès, je le sens. Nous attendons cette année plus d'équipes mais aussi plus de personnes et plus de sponsors. Merci 16/6 ».

Le Championnat de football de Nérette réunit cette année douze équipes. Supporté pour cette Edition par la plateforme communautaire de ce quartier et le Comité de Gestion de l'espace récréatif, il a débuté le dimanche 11 août pour se terminer le 08 septembre 2013, il se joue dans l'après-midi et offre comme par le passé aux petits marchands du quartier et des quartiers limitrophes l'occasion de faire fructifier leur avoir et ainsi être plus en mesure de s'acquitter des frais de l'écolage de leurs enfants. La réouverture des classes fixée officiellement pour le 02 septembre est un sujet causant l'insomnie de beaucoup de parents.

Assainir pour vivre plus longtemps !

« Je n'ai aucune idée de l'espérance de vie des Haïtiens, encore moins de ceux des gens de ma communauté, mais je sens que je vais de mieux en mieux et que ces travaux ajoutent à mes ans ». C'est en ces mots que François Moleste nous décrit sa satisfaction par rapport à ce qui se fait depuis plusieurs semaines comme travaux pour assainir Cité Théard, un des grands blocs du quartier de Villa Rosa où le projet 16/6 intervient.

Mercredi 7 août 2013, il est 14 heures 10. Revenant de la pause du midi, une cinquantaine d'hommes et de femmes, tous vivant à Villa Rosa et arborant le gilet vert fluorescent du 16/6 se passent jusqu'au point de déversement des « bokit » de détritus. Ces braves citoyens qui se protègent par des cache-nez et des gants ont en commun ce ras-le-bol des déchets, qu'ils avaient exprimé lors du vote des scénarios au mois de février 2013 sur un terrain de l'Impasse Guercy. C'est donc avec fierté qu'ils se débarrassent de ce mélange assassin de terre, de tissus, de déchets plastiques, de boue et d'excréments d'animaux qui a pollué la zone et constitue depuis des années l'une des menaces les plus meurtrières pour les milliers d'âmes qui se partagent l'espace. « Nous disons par ce ''konbit'' A bas fatras ! Et Vive la santé ! » crie Brutus Jacqueline, qui récupère les « bokit » au point d'arrivée pour les ramener là où ils sont remplis.

Le site où ces braves gens travaillent existe dans ces conditions depuis plus de dix ans. Le tremblement de terre de janvier 2010 avec ses tonnes de débris est venu amplifier la situation. Villa Rosa est un des quartiers de Port-au-Prince, dans la zone de Canapé-Vert où les problèmes d'assainissement étaient devenus des plus criants. En plus de Cité Théard, le projet 16/6 assainit Trou Rosemont et l'un des plus vastes sites de décharge de détritus connu sous le nom de Golgotha, une montagne d'immondices qui surplombait le quartier. Des activités qui permettent à plus d'une centaine d'hommes et de femmes de gagner de l'argent mais surtout de contribuer à faire de ce quartier un endroit sain où l'on peut être enfin fier de vivre.

Le projet 16/6 dans son souci de faire œuvre qui dure a mis sur pied non seulement des plateformes communautaires dans tous les quartiers d'intervention mais aussi des comités pour gérer les investissements. C'est ainsi qu'un comité d'assainissement fonctionne à Villa Rosa et doit permettre aux résidents de la zone de ne plus faire face à des problèmes d'insalubrité comme par le passé.

Source : Charlito Louissaint/ Communications 16/6
